



Justis- og  
beredskapsdepartementet

metier®

# Politiets nasjonale beredskapssenter

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Åpent møte Ski kommune, mandag 31. oktober 2016

Åpent møte Oppegård kommune, onsdag 02. november 2016



# Hensikten med åpent møte

- orientere om prosjektet nytt beredskapssenter
- orientere om reguleringsprosessen og planprogrammet
- få innspill til reguleringsaken
- besvare spørsmål

18:30	Gunnar A. Johansen, Justis- og beredskapsdepartementet	Velkommen
18:40	Magnus Ståle Skaar, Justis- og beredskapsdepartementet	Om beredskapssenteret og valg av Taraldrud
18:55	Ole Vidar Dahl, Politiets nasjonale beredskapsressurser	Om de ulike beredskapsenhetene
19:10	Paul Torgersen, Metier	Om prosjektet og tidsplanen
19:25	Petter Christensen, Asplan Viak	Om planprogrammet og mulighet for innspill
19:50	Gunnar A. Johansen + panel	Spørsmål
20:30		Slutt

Rolle i statlig regulering	Aktør
Planmyndighet	Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forvalter av Markaloven	Klima- og miljødepartementet
Vertskommune	Ski
Samarbeidende kommuner	Ski og Oppegård
Tiltakshaver og forslagsstiller	Justis- og beredskapsdepartementet
Bruker av anlegget	Politiet
Prosjektledelse	Metier
Rådgiver i reguleringsarbeidet	Asplan Viak
Prosjekteringsgruppen	Nordic, COWI, mfl



- Magnus S. Skaar, Justis- og beredskapsdepartementet



# Hvorfor Politiets nasjonale beredskapssenter?

- Samle ressursene
- Bedre politiets innsatsevne
- Raskere responstid
- Bedre responskvalitet



# Kriterier for valg av tomt

- Kjøretid til Oslo sentrum
- Kjøretid til Gardermoen
- Fleksibilitet og størrelse
- Flyoperative krav
- Avstand til boliger

# Historien




Justis- og  
beredskapsdepartementet

metier®

**22. juli 2011:**

**I dag**



**Tidligere  
utredninger  
tilbake til 2003**

**Utredning;  
aktuell tomt på Alna**  
Politidirektoratet

**Planprosess og  
skisseprosjekt Alna**  
Statsbygg

**Konseptvalg-  
utredning**  
Politidirektoratet

**KS1 av konsept-  
valgutredning**  
Finansdep. og  
Justisdep.

**Forprosjekt m/valg  
mellom Grønmo og  
Taraldrud**  
Justisdep.





- Ole Vidar Dahl, politiet



# Hva er et beredskapssenter?

- Samling av politiets nasjonale beredskapsressurser
- Kompetansesenter
- Egne transportmidler
- Rask respons



# Hvem skal bruke beredskapssenteret?



Beredskapstroppen



Krise- og  
gisselforhandlertjenesten



Bombetjenesten



Politihelikoptertjenesten



# Hva skal det brukes til?

- Spesiell tilpasset trening
- Trening og beredskap på samme sted
- Restriksjoner på bruk



- Paul Torgersen, Metier - prosjektleder

# Plassering av beredskapssenteret



Justis- og  
beredskapsdepartementet

metier®



# Plassering av beredskapssenteret



Justis- og  
beredskapsdepartementet

metier®



Snipeåsen

Skiløype

Taraldrud

Turvei

Skiløype

POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER



E6 mot Oslo

Eksempel på utforming  
av beredskapssenteret

E6


Snipetjern

Snipeåsen

- Hovedbygg
- Treningsbygg
- Helikopterfasiliteter
- Skytebane og treningsfasiliteter
- Utfartsveier



# Taraldrud

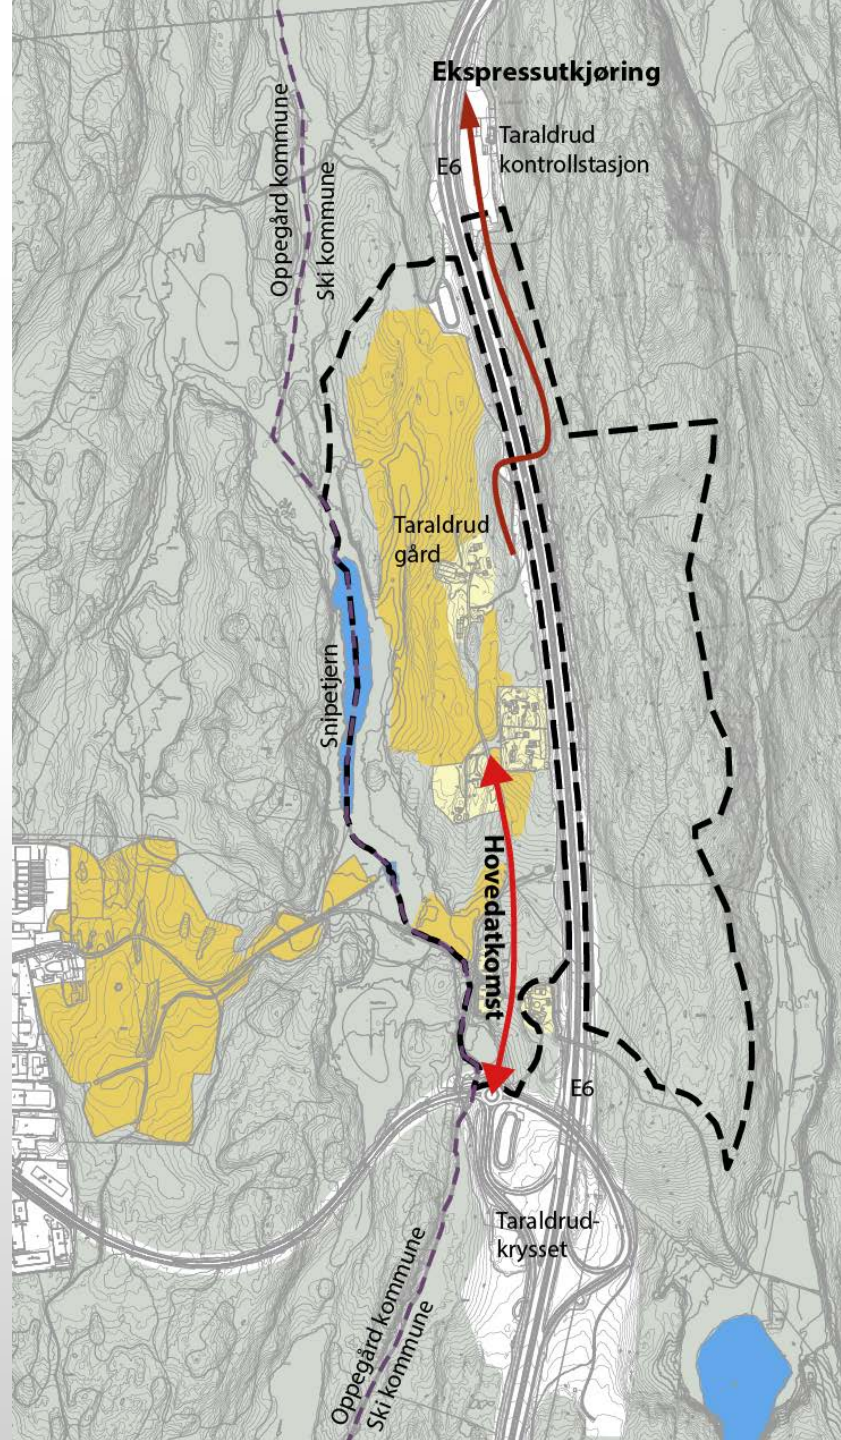

Justis- og beredskapsdepartementet

metier®





# Planlagte hovedmilepæler

- Reguleringsplan vedtatt september 2017
- Underlag for beslutning i Stortinget innen utgangen av 2017
- Forventet byggestart første halvdel av 2018
- Forventet ferdigstillelse første halvdel av 2021



- Petter Christensen, Asplan Viak




metier®

		2016												2017												2018											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>Reguleringsplan</b>	Ca. ferdig																																				
Planprogram utarbeides	01.sep.16																																				
Planprogram høring	07.des.16																																				
Informasjonsmøte	31.okt.16									X																											
KMD fastsetter planprogram	01.feb.17																																				
Konsekvensutredning	01.mar.17																																				
Reguleringsplan	01.apr.17																																				
Reguleringsplan høring	01.jun.17																																				
KMD vedtar reguleringsplan	01.sep.17																																				
<b>Konsesjon for helikopterlandingsplass</b>																																					
Søknad om konsesjon	02.sep.17																																				
Høringsperiode	01.des.18																																				
Luftfartstilsynet konsesjon	01.jan.18																																				
<b>Byggeprosjektet</b>																																					
Skisseprosjekt	01.mar.17																																				
Forprosjekt	01.okt.17																																				
Prosjektering entreprenør	01.okt.17																																				
Kvalitetssikret forprosjekt KS2	01.okt.17																																				
Stortingsbehandling	31.des.17																																				
Byggesaksbehandling	01.feb.18																																				
Bygging	1. halvår 2021																																				






		2016												2017												2018											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>Reguleringsplan</b>	<b>Ca. ferdig</b>																																				
Planprogram utarbeides	01.sep.16																																				
<b>Planprogram høring</b>	07.des.16																																				
Informasjonsmøte	31.okt.16																																				
KMD fastsetter planprogram	01.feb.17																																				
Konsekvensutredning	01.mar.17																																				
Reguleringsplan	01.apr.17																																				
Reguleringsplan høring	01.jun.17																																				
KMD vedtar reguleringsplan	01.sep.17																																				
<b>Konsesjon for helikopterlandingsplass</b>																																					
Søknad om konsesjon	02.sep.17																																				
Høringsperiode	01.des.18																																				
Luftfartstilsynet konsesjon	01.jan.18																																				
<b>Byggeprosjektet</b>	01.feb.17																																				
Skisseprosjekt	01.mar.17																																				
Forprosjekt	01.okt.17																																				
Prosjektering entreprenør	01.okt.17																																				
Kvalitetssikret forprosjekt KS2	01.okt.17																																				
Stortingsbehandling	31.des.17																																				
Byggesaksbehandling	01.feb.18																																				
Bygging	1. halvår 2021																																				






		2016												2017												2018																	
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
<b>Reguleringsplan</b>	Ca. ferdig	[Grey bar]																																									
Planprogram utarbeides	01.sep.16																																										
Planprogram høring	07.des.16																																										
Informasjonsmøte	31.okt.16								X																																		
KMD fastsetter planprogram	01.feb.17																																										
Konsekvensutredning	01.mar.17																																										
Reguleringsplan	01.apr.17																																										
<b>Reguleringsplan høring</b>	01.jun.17																																										
KMD vedtar reguleringsplan	01.sep.17																																										
<b>Konsesjon for helikopterlandingsplass</b>		[Grey bar]																																									
Søknad om konsesjon	02.sep.17																																										
Høringsperiode	01.des.18																																										
Luftfartstilsynet konsesjon	01.jan.18																																										
<b>Byggeprosjektet</b>	01.feb.17	[Grey bar]																																									
Skisseprosjekt	01.mar.17																																										
Forprosjekt	01.okt.17																																										
Prosjektering entreprenør	01.okt.17																																										
Kvalitetssikret forprosjekt KS2	01.okt.17																																										
Stortingsbehandling	31.des.17																																										
Byggesaksbehandling	01.feb.18																																										
Bygging	1. halvår 2021																																										






		2016												2017												2018																		
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
<b>Reguleringsplan</b>	Ca. ferdig																																											
Planprogram utarbeides	01.sep.16																																											
Planprogram høring	07.des.16																																											
Informasjonsmøte	31.okt.16																																											
KMD fastsetter planprogram	01.feb.17																																											
Konsekvensutredning	01.mar.17																																											
Reguleringsplan	01.apr.17																																											
Reguleringsplan høring	01.jun.17																																											
<b>KMD vedtar reguleringsplan</b>	01.sep.17																																											
<b>Konsesjon for helikopterlandingsplass</b>																																												
Søknad om konsesjon	02.sep.17																																											
Høringsperiode	01.des.18																																											
Luftfartstilsynet konsesjon	01.jan.18																																											
<b>Byggeprosjektet</b>	01.feb.17																																											
Skisseprosjekt	01.mar.17																																											
Forprosjekt	01.okt.17																																											
Prosjektering entreprenør	01.okt.17																																											
Kvalitetssikret forprosjekt KS2	01.okt.17																																											
Stortingsbehandling	31.des.17																																											
Byggesaksbehandling	01.feb.18																																											
Bygging	1. halvår 2021																																											





		2016												2017												2018																								
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
<b>Reguleringsplan</b>	Ca. ferdig																																																	
Planprogram utarbeides	01.sep.16																																																	
Planprogram høring	07.des.16																																																	
Informasjonsmøte	31.okt.16																																																	
KMD fastsetter planprogram	01.feb.17																																																	
Konsekvensutredning	01.mar.17																																																	
Reguleringsplan	01.apr.17																																																	
Reguleringsplan høring	01.jun.17																																																	
KMD vedtar reguleringsplan	01.sep.17																																																	
<b>Konsesjon for helikopterlandingsplass</b>																																																		
Søknad om konsesjon	02.sep.17																																																	
<b>Høringsperiode</b>	01.des.18																																																	
Luftfartstilsynet konsesjon	01.jan.18																																																	
<b>Byggeprosjektet</b>	01.feb.17																																																	
Skisseprosjekt	01.mar.17																																																	
Forprosjekt	01.okt.17																																																	
Prosjektering entreprenør	01.okt.17																																																	
Kvalitetssikret forprosjekt KS2	01.okt.17																																																	
Stortingsbehandling	31.des.17																																																	
Byggesaksbehandling	01.feb.18																																																	
Bygging	1. halvår 2021																																																	







# To faser i reguleringsprosessen:


## Planprogram: Høring til 7. desember 2016

- Redegjør for planprosessen og temaer som skal konsekvensutredes

## Reguleringsplan med konsekvensutredning:

Høring april - mai 2017 - vedtak september

- Reguleringskart
- Reguleringsbestemmelser
- Konsekvensutredninger

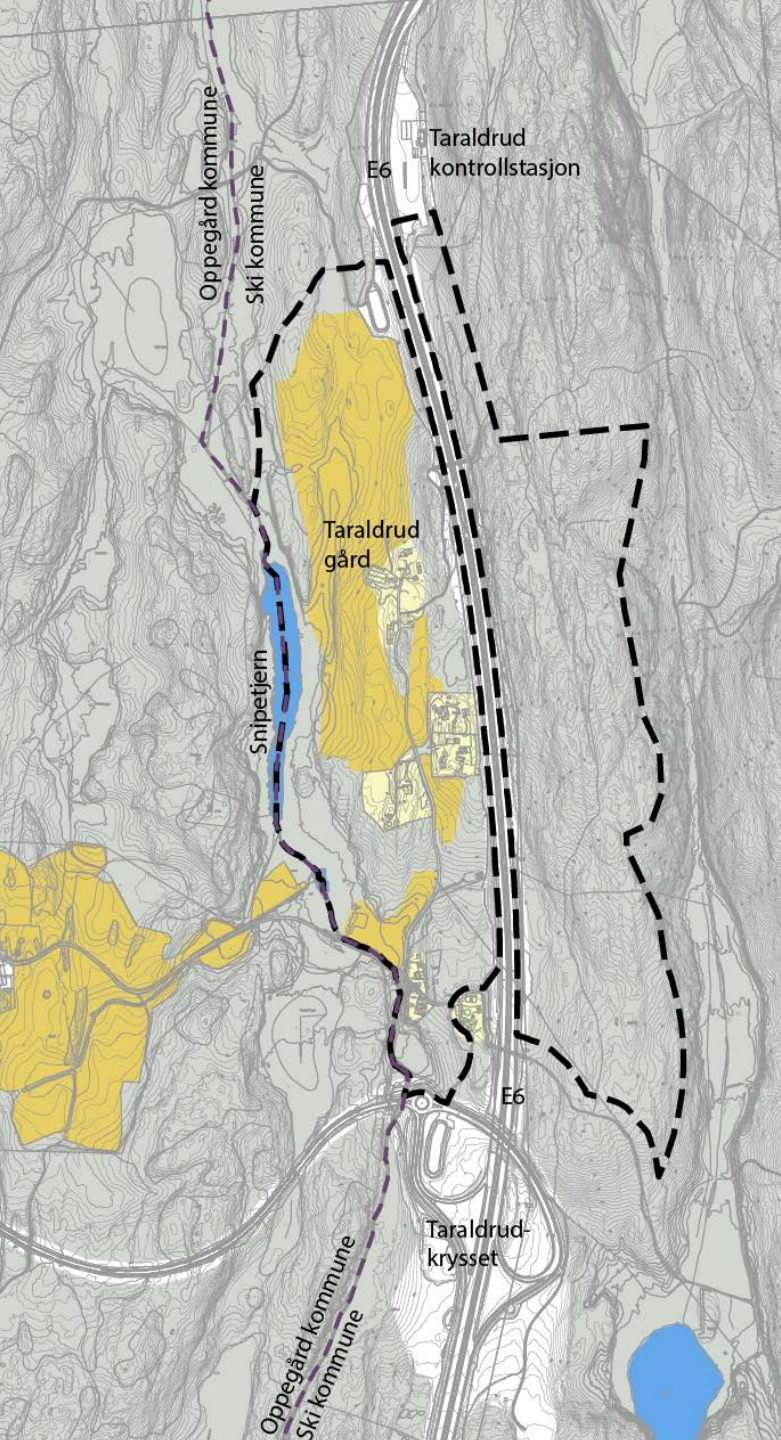



# Markaloven §6 og §7.

## *Unntak for tiltak i kommunale eller statlige planer*

### §6

Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka, krever tillatelse av departementet.

### § 7

Departementet kan fravike forbudet i § 5 ved statlig arealplan etter plan- og bygningsloven § 6-4.

- Markaloven forvaltes av Klima- og miljødepartementet
- Klima- og miljødepartementet ga i brev til JD 20.09.2016 tillatelse til å starte planlegging i Marka
- Vedtatt reguleringsplan skal stadfestes av Klima- og miljødepartementet



## Klima- og miljødepartementet forutsetter at det legges særlig vekt på følgende momenter i planleggingen:

- Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner.
- Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.
- Støy må utredes særskilt.



## Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune

Høring og offentlig ettersyn, 24.10.2016



## Planprogrammet skal gjøre rede for

- Formålet med planarbeidet
- Planprosessen
- Opplegg for medvirkning
- Alternativer som vil bli vurdert
- Behovet for utredninger



# Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune

Høring og offentlig ettersyn, 24.10.2016



1	Innledning .....	4
1.1	Bakgrunn og formål .....	4
1.2	Mål og overordnende føringer .....	5
2	Prosess og medvirkning .....	6
2.1	Planprosess .....	6
2.2	Medvirkning.....	7
3	Politiets nasjonale beredskapssenter .....	9
4	Planområdet .....	11
4.1	Beliggenhet og størrelse .....	11
4.2	Beskrivelse av planområdet og tilliggende områder .....	12
4.3	Eierforhold .....	15
5	Planstatus og rammebetingelser .....	16
5.1	Overordnede planer og føringer .....	16
5.2	Annet grunnlagsmateriale .....	17
5.3	Gjeldene reguleringsplaner .....	17
5.4	Pågående planarbeid .....	17
6	Problemstillinger og forslag til utredninger .....	19
6.1	Generelt .....	19
6.2	Referansealternativet .....	19
6.3	Forholdet til overordnede planer og mål .....	19
6.4	Friluftsliv, herunder barn og unges interesser .....	19
6.5	Naturmiljø og biologisk mangfold .....	20
6.6	Vannmiljø .....	20
6.7	Kulturmiljø .....	21
6.8	Bebyggelse og landskap .....	22
6.9	Landbruk .....	22
6.10	Universell utforming .....	22
6.11	Klima- og energihensyn .....	23
6.12	Teknisk infrastruktur .....	23
6.13	Støy .....	23
6.14	Grunnforhold .....	24
6.15	Trafikk .....	24
6.16	Anleggsperioden .....	24
6.17	Risiko og sårbarhet .....	25
6.18	Miljøoppfølgingsplan .....	25
6.19	Metode .....	25





- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
- Naturmiljø og biologisk mangfold
- Vannmiljø
- Kulturmiljø
- Bebyggelse og landskap
- Landbruk
- Universell utforming
- Klima- og energihensyn
- Teknisk infrastruktur
- Støy fra helikopter og øvelser med våpen og eksplosiver
- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet

- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser



- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet



- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser



- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet

- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
- **Naturmiljø og biologisk mangfold**
- Vannmiljø
- Kulturmiljø
- Bebyggelse og landskap
- Landbruk
- Universell utforming
- Klima- og energihensyn
- Teknisk infrastruktur
- Støy fra helikopter og øvelser med våpen og eksplosiver
- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet



- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
- Naturmiljø og biologisk mangfold
- **Vannmiljø**
- Kulturmiljø
- Bebyggelse og landskap
- Landbruk
- Universell utforming
- Klima- og energihensyn
- Teknisk infrastruktur
- Støy fra helikopter og øvelser med våpen og eksplosiver
- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet



- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
- Naturmiljø og biologisk mangfold
- Vannmiljø
- **Kulturmiljø**
- Bebyggelse og landskap
- Landbruk
- Universell utforming
- Klima- og energihensyn
- Teknisk infrastruktur
- Støy fra helikopter og øvelser med våpen og eksplosiver
- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet




- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
- Naturmiljø og biologisk mangfold
- Vannmiljø
- Kulturmiljø
- **Bebyggelse og landskap**
- Landbruk
- Universell utforming
- Klima- og energihensyn
- Teknisk infrastruktur
- Støy fra helikopter og øvelser med våpen og eksplosiver
- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet





- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
- Naturmiljø og biologisk mangfold
- Vannmiljø
- Kulturmiljø
- Bebyggelse og landskap
- Landbruk
- Universell utforming
- Klima- og energihensyn
- Teknisk infrastruktur
- **Støy fra helikopter og øvelser med våpen og eksplosiver**
- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet

- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og ungdomsinteresse
- Naturmiljø og biologisk mangfold
- Vannmiljø
- Kulturmiljø
- Bebyggelse og landskap
- Landbruk
- Universell utforming
- Klima- og energihensyn
- Teknisk infrastruktur
- Støy fra helikopter og øvelser med våpen og eksplosiv
- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sikkerhet

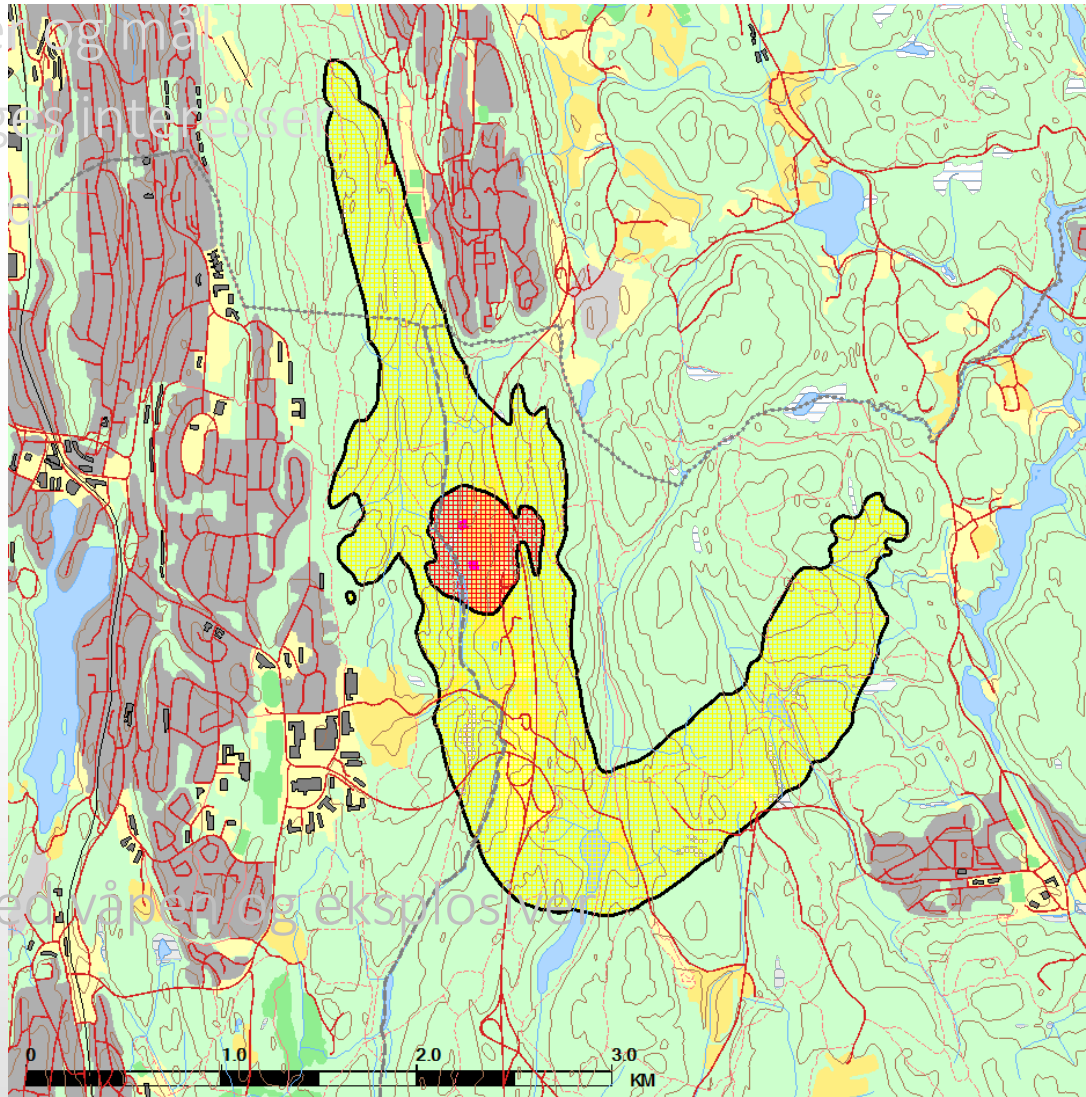

- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
- Naturmiljø og biologisk mangfold
- Vannmiljø
- Kulturmiljø
- Bebyggelse og landskap
- Landbruk
- Universell utforming
- Klima- og energihensyn
- Teknisk infrastruktur
- Støy fra helikopter og øvelser med våpen og eksplosiver
- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet







- Forholdet til overordnede planer og mål
- Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
- Naturmiljø og biologisk mangfold
- Vannmiljø
- Kulturmiljø
- Bebyggelse og landskap
- Landbruk
- Universell utforming
- Klima- og energihensyn
- Teknisk infrastruktur
- Støy fra helikopter og øvelser med våpen og eksplosiver
- Grunnforhold
- Trafikk
- Anleggsperioden
- Risiko og sårbarhet

# Oppsummering

		2016												2017											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>Reguleringsplan</b>		<b>Ca. ferdig</b>																							
Planprogram utarbeides	01.sep.16																								
Planprogram høring	07.des.16																								
Informasjonsmøte	31.okt.16																								
KMD fastsetter planprogram	01.feb.17																								
Konsekvensutredning	01.mar.17																								
Reguleringsplan	01.apr.17																								
Reguleringsplan høring	01.jun.17																								
KMD vedtar reguleringsplan	01.sep.17																								

Justis- og beredskapsdepartementet:

- E-post: postmottak@jd.dep.no
- Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo



- Spørsmål til panelet

# Mer informasjon

- [beredskapssenterer.regjeringen.no](https://beredskapssenterer.regjeringen.no)



The screenshot shows the website for the National Police Preparedness Center. At the top, there is a header with the logo of the Department of Justice and Emergency Preparedness and the text 'Justis- og beredskapsdepartementet'. Below this is a dark blue navigation bar with the title 'Politiets nasjonale beredskapssenter' and a search bar with the text 'Søk' and a 'Søk' button. Underneath the navigation bar is a light gray menu with the following items: 'Om beredskapssenteret', 'Dokumenter', 'Spørsmål og svar', 'Aktuelt', and 'Kontakt'. The main content area has a breadcrumb trail 'Du er her: Politiets nasjonale beredskapssenter • Kontakt' and two icons for 'Del/tips' and 'Skriv ut'. The title 'Kontakt' is prominently displayed. Below the title, there is a paragraph: 'Alle spørsmål og henvendelser om beredskapssenteret skal rettes til Justis- og beredskapsdepartementet.' This is followed by contact details: 'E-post: [postmottak@jd.dep.no](mailto:postmottak@jd.dep.no)', 'Telefon: 22 24 90 90', and 'Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo'. On the right side of the page, there is a section titled 'ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV' with a form for 'E-post \*' and a blue 'Abonner!' button.
